

関係各位

教養学部等事務部経理課

お知らせ

仮設体育館工事のため下記のとおり工事車両が通行しますのでお知らせいたします。

作業期間中はご迷惑をおかけしますがご協力よろしくお願いいたします。

記

・作業日時

- ① 平成30年4月17日（火曜日）  
AM 8:30からPM 2:00まで
- ② 平成30年5月 1日（火曜日）  
AM 8:30からPM 5:00まで
- ③ 平成30年5月 2日（水曜日）  
AM 8:30からPM 5:00まで

・作業内容 コンクリート打設

通行予定車両（別図参照）  
大型車両の通行を予定しています。

・工事責任者 郡リース（株） 現場代理人 中内史郎

電話 080(3537)5291

以上

### 東京大学（駒場 I）仮設体育館設置工事 案内図 KOHRI

現場入場の際し、下記ルールを厳守してください。

- ・車両搬入の際には担当者に連絡の上誘導員に従ってください。  
(現場近隣に駐車、待機不可)
- ・大型貨物（積載5t以上）は事前に通行許可申請が必要です。
- ・左記に記したルート以外走行禁止。  
※近隣住宅街の為道狭く出れなくなります。  
※制限速度30km/hを守る事
- ・スクールゾーンにAM: 7:30~ 8:30は搬入通勤禁止。  
PM: 14:00~16:00も原則通行禁止。  
※4月については、駒場小学校と密に連絡を取り  
その都度調整をする。(12時ごろ下校)


現場施工に関し、下記ルールを厳守してください。

- ・現場作業時間は原則 8:00~17:00
- ・残業のある場合は打ち合わせ時に申し出てください。
- ・朝礼は8:00開始と致します。
- ・事務詰所以外の喫煙は厳禁と致します。
- ・休憩も事務詰所のみ。外での休憩厳禁。
- ・作業間打合せは毎日 13:00 より現場事務所で行います。

■ 現場住所 〒153-0041 東京都目黒区駒場3丁目8-1駒場 I キャンパス 郡リース株式会社 現場事務所



工事車両通行経路

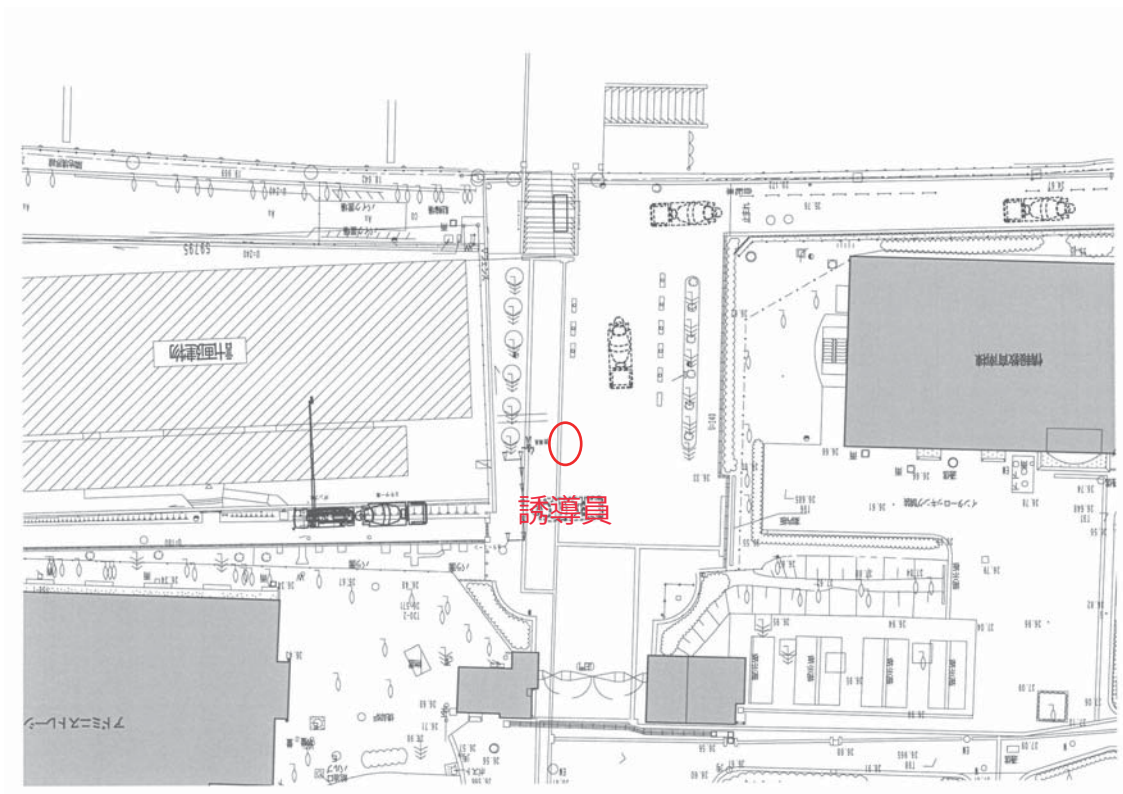

正門付近詳細図

作業日時 通行内容 (車両間隔 20分程度)

※4月17日 坂下門から東大正門までの間

AM8:30~14:00の間 ミキサー車 (7台) の搬出入

※5月1日 坂下門から東大正門までの間

AM8:30~17:00の間 ミキサー車 (16台) の搬出入

※5月2日 坂下門から東大正門までの間

AM8:30~17:00の間 ミキサー車 (14台) の搬出入
