


体育施設整備進捗状況


2018/06/09 現在



外 観

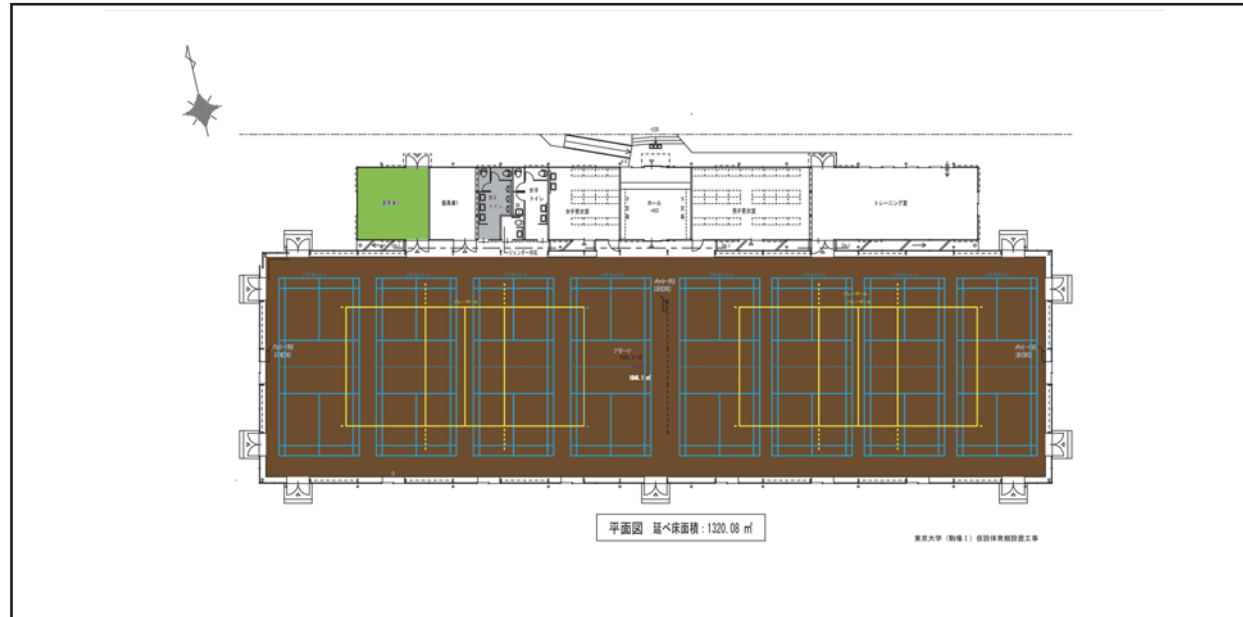

アリーナ

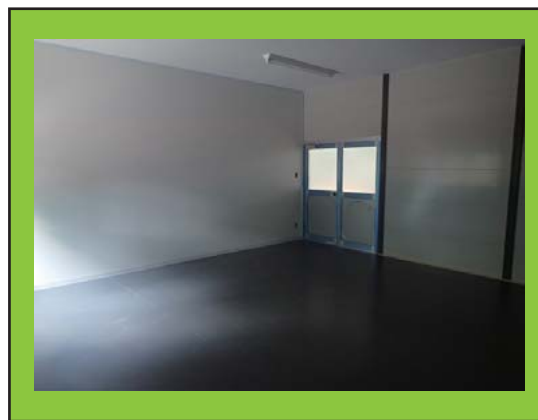

器具庫2



男子トイレ

工事名 東京大学(駒場 I)仮設体育館設置工事

6 月 工程表

郡リース株式会社

承諾

承諾

現場代理人



工期 平成 29年 10月 12日～平成 30年 5月 31日

工 事 工 程	月	6																													7							
	日程 曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1						
工 種 名		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日						
検査																																						
仮設工事																																						
板金樋工事																																						
木 工 事																																						
内装下地																																						
内装仕上げ																																						
塗装工事																																						
アリーナ床工事																																						
雑 工 事																																						
外構工事																																						
電気設備工事																																						
給排水衛生設備工事																																						

備 考

工事名称		期間 自 平成30年6月3日 ~至 平成30年6月23日															現場代理人	中内	担当者			
東京大学仮設体育館設置工事		郡リース株式会社																				
週	先週	今週					来週															
月日	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
																					社内検査 消防検査	
仮設工事		昇降足場解体 仮囲盛替え															事務所・詰所撤去		美装工事		環境測定	
プレハブ工事																						
木工事					B棟巾木 A棟押縁																	
内装下地/仕上げ						B棟	床長尺シート貼り															
アリーナ床工事		ベースパネル敷、下地ベニヤ張り				フローリング貼り						研磨塗装 ライン引き								ハレー/バトミントン金物取付		
鋼製建具工事												ガラス入れ									SD/AD金物付調整	
板金樋工事		庇 樋 外装鋼板貼り																			EPJ	
塗装工事	B棟	壁ボード下地処理 塗装					塗り床															
雑工事																					室名札ブラインド/カーテン/棒球ネット	
外構工事		路盤調整 U字溝整備			路盤調整 U字溝整備						アスファルト舗装		外階段 木一丁躯体								手すり取付	
																					左官補修	
電気設備工事		B棟 器具付け 試掘							B棟照明 器具付け													各所調整
給排水衛生設備工事			外部試掘		埋設配管				衛生器具取付													各所調整
行事		パラ会説明		試掘確認		試掘確認					定例会議 15:00		事務所 引越し									
搬入計画		目黒区道路管理課 立金																				
備考	A棟:アリーナ B棟:トレーニング																					

工事名称		期間 自 平成30年6月10日 ~至 平成30年6月30日																			現場代理人	中内	担当者		
東京大学仮設体育館設置工事		郡リース株式会社																							
週	先週	今週						来週																	
	月日	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土			
仮設工事																									
プレハブ工事																									
木 工事																									
内装下地/仕上げ																									
アリーナ床工事																									
鋼製建具工事																									
板金樋工事																									
塗装工事	B棟																								
雑 工事																									
外構工事																									
電気設備工事																									
給排水衛生設備工事																									
行 事																									
搬入計画																									
備考	A棟:アリーナ B棟:トレーニング																								
