体育施設整備進捗状況

2018/06/01 現在

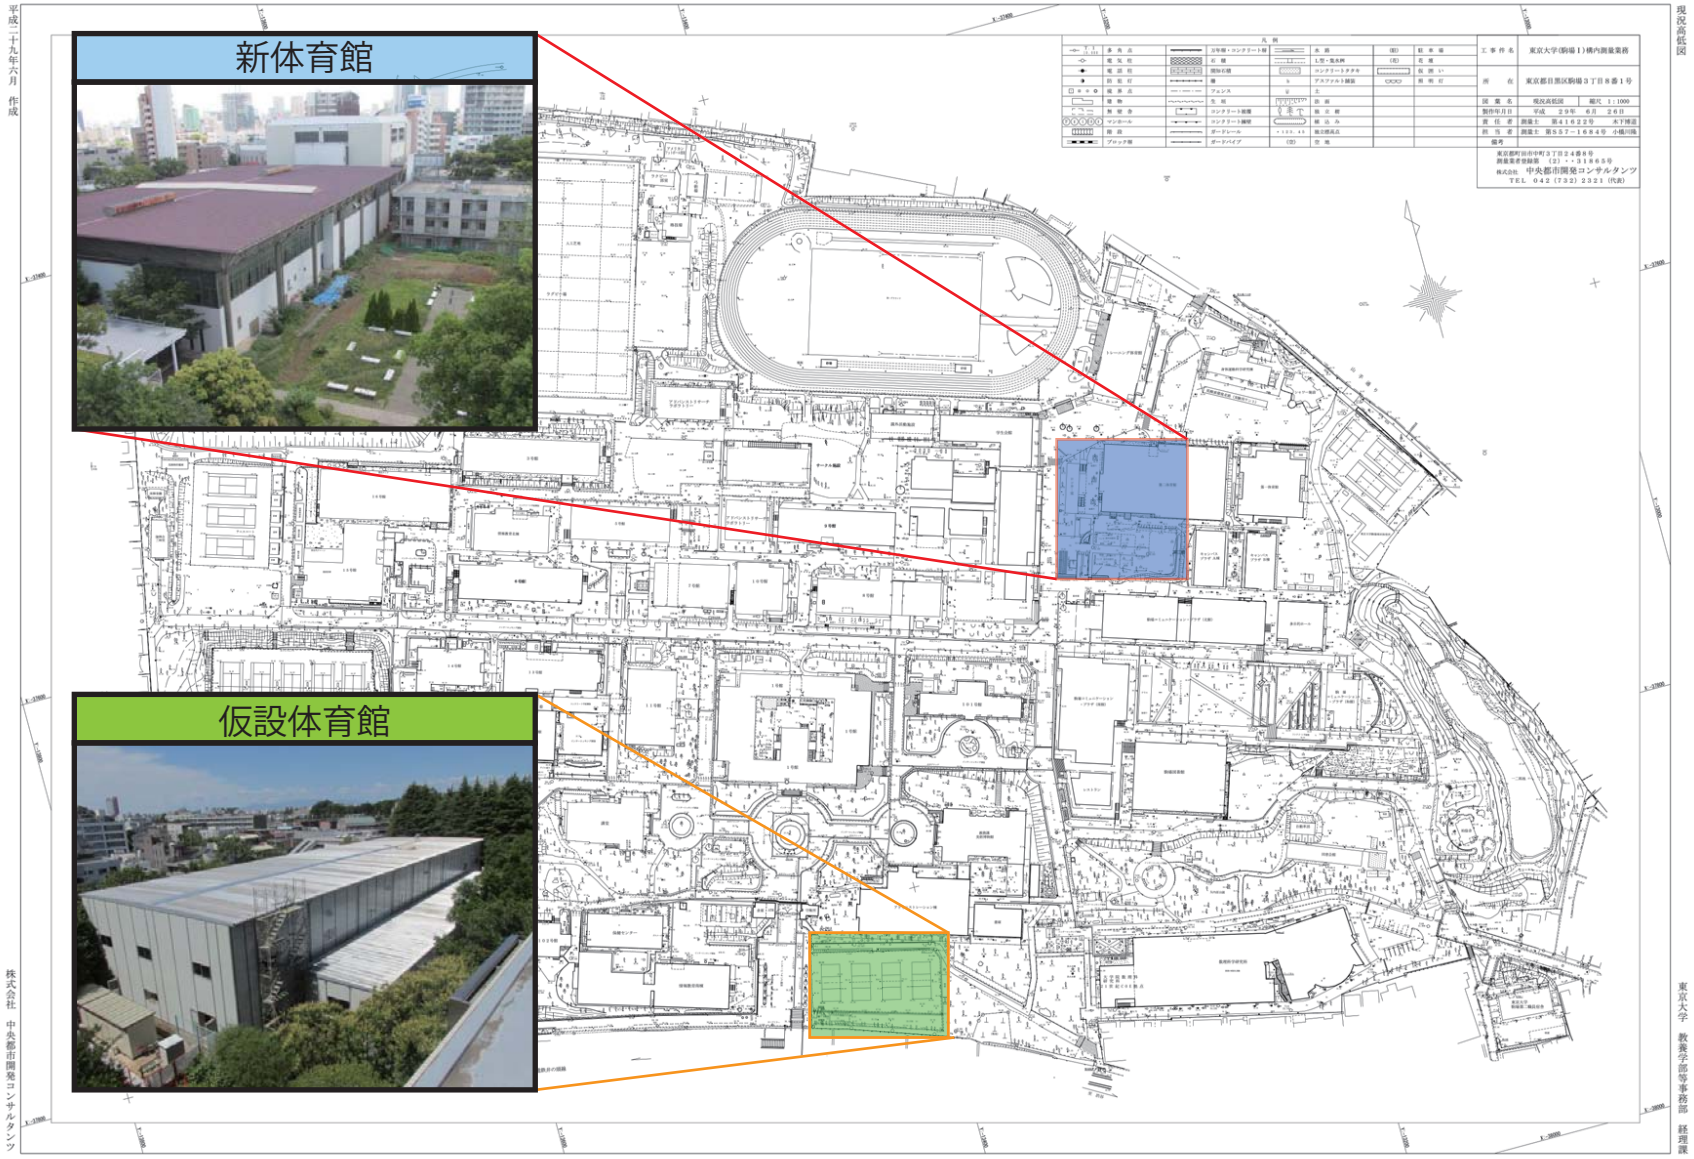

工事名　東京大学(駒場Ⅰ)仮設体育館設置工事

6月工程表

郡リース株式会社

工期　平成 29年 10月 12日～平成 30年 5月 31日

承諾	承諾	現場代理人
		中内

工事工程 / 工種名	月	6																														6	7
	日程	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1
	曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
検査																					郡社内検査	消防検査			建築完了検査							
仮設工事				昇降足場・敷鉄板撤去														事務所/詰所撤去			美装工事												
板金樋工事		雨押さえ		庇 樋 外装鋼板貼り																		EP,J											
木 工事		腰壁有孔ベニヤ貼り/巾木						A棟押縁 B棟巾木																									
		接続部天井ボード貼り																														
内装下地		腰壁ベニヤ下地																														
内装仕上げ																床長尺シート貼り/巾木付け																
塗装工事													B棟	間仕切り塗装			塗り床															
アリーナ床工事					ベースパネル敷 合板敷					フローリング敷						研磨塗装			ライン引き														
																						サイン付け										
雑 工事																		スロープ手すり			プライント'/カーテン/棒球ネット取付										
																		トイレブース														
外構工事		不陸調整			路盤									外階段 ポーチ スロープ躯体					アスファルト舗装													
電気設備工事		A棟照明/換気扇/他器具付取付					引き込み配線工事						B棟照明他器具付け						各所調整														
給排水衛生設備工事							給排水配管埋設工事										衛生器具取付			各所調整												
							排水ポンプ据付け																											

備　考
